

INFORME EJECUTIVO DE SEGUIMIENTO

13/01/2020-28/01/2020

PROYECTO:

**FASE DE IDENTIFICACIÓN DEL PLAN PILOTO "PNIS" PARA EL
MUNICIPIO DE MIRANDA, CAUCA**

Resumen de actividades del periodo:

Actividades realizadas / en curso	Realizada	En curso
Identificación indicadores del proyecto	x	
Identificación ficha técnica del Municipio	x	

TABLERO DE CONTROL


	VARIACIÓN DE ACUERDO A LO PLANEADO
INTEGRACIÓN	
ALCANCE	
TIEMPO	
COSTO	
CALIDAD	
RR.HH.	
COMUNICACIÓN	
RIESGOS	
ADQUISICIONES	
INTERESADOS	

INDICADOR	
0%	OK
DE 0% A 20%	ATENCIÓN
>20%	PELIGRO

INFORME DE COSTOS


Nombre	Costo real	Costo restante	Costo de línea base	Trabajo real	Trabajo restante	Costo
FASE IDENTIFICACION PNIS	\$19.687.500	\$33.425.000	\$52.825.000	815 horas	2.529 horas	\$53.112.500

Como se aprecia en la siguiente gráfica nuestro IRC se mantiene por encima de 1 y oscila entre 1.00029 y 1.00032. Es decir que no se han presentado sobrecostos hasta la fecha.

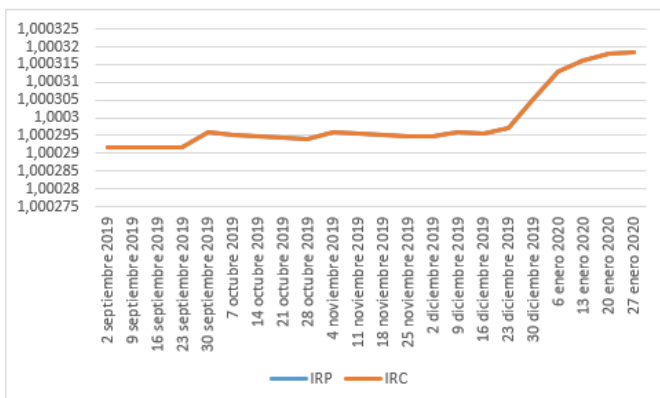


ÍNDICES EN EL TIEMPO

Índices de rendimiento de costo y programación para el proyecto basados en la fecha de estado. Cuanto mayor sea el índice de rendimiento, más avanzado en la programación y el ahorro de costos estará el proyecto.

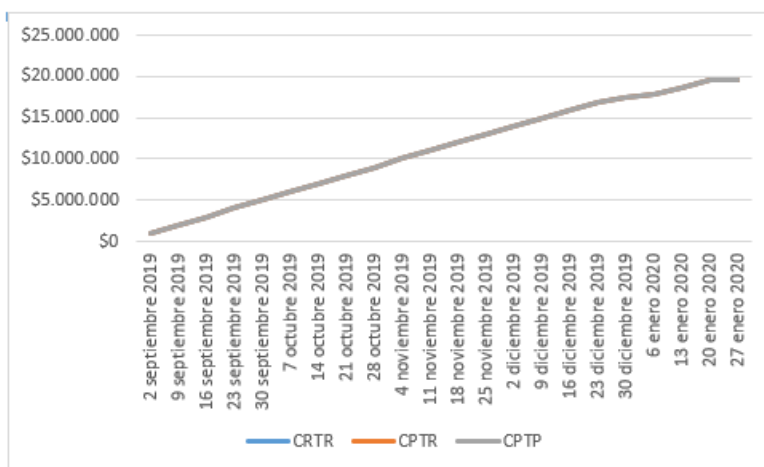

VALOR ACUMULADO EN EL TIEMPO

El valor acumulado del proyecto basado en la fecha de estado. Si el costo real (CRTR) es superior al valor acumulado (CPTR), el proyecto está por encima del presupuesto. Si el valor planeado (CPTP) es mayor que el valor acumulado, el proyecto está atrasado respecto a la programación.

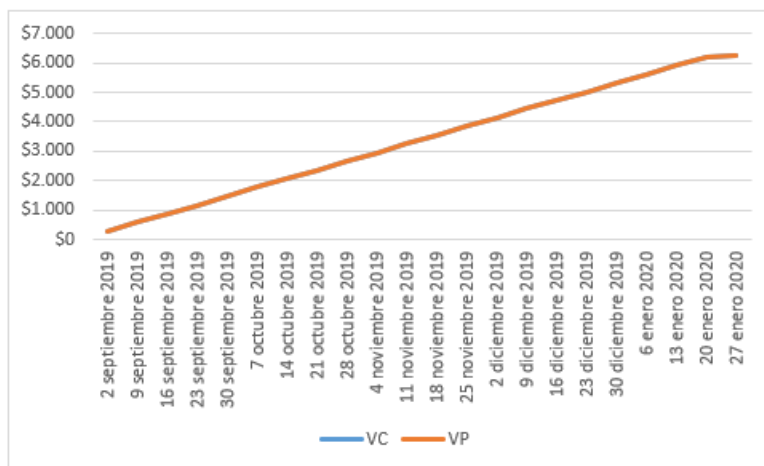

VARIACIÓN EN EL TIEMPO

Variaciones de costo y calendario para el proyecto basadas en la fecha de Estado. Si el CV es negativo, el proyecto es más de lo presupuestado. Si el VP es positivo el proyecto está retrasado con respecto a la programación.

En cuanto al valor acumulado podemos ver que el costo real del trabajo realizado, el costo presupuestado del trabajo planificado y el costo presupuestado del trabajo realizado son iguales y la variación de programación y la programación de costo son cercanos a \$6,000 pesos.

INFORME DE RECURSOS

ESTADO DE LOS RECURSOS


Resta trabajo para todos los recursos de trabajo

Nombre	Comienzo	Fin	Trabajo restante
Gerente de Proyectos	2 septiembre 2019	24 junio 2020	421 horas
Ingeniera Civil	25 febrero 2020	17 junio 2020	368 horas
Mercadologo	7 febrero 2020	12 junio 2020	348 horas
Ingeniero Agronomo	13 febrero 2020	24 junio 2020	455 horas
Extensionista	13 enero 2020	9 junio 2020	385 horas
Auxiliar 1	7 febrero 2020	19 marzo 2020	192 horas
Auxiliar 2	7 febrero 2020	10 marzo 2020	144 horas
Auxiliar 3	10 febrero 2020	16 marzo 2020	120 horas
Auxiliar 4	12 febrero 2020	18 marzo 2020	96 horas

Durante este periodo únicamente han tenido trabajo el gerente de proyectos y el extensionista.


ESTADO DEL TRABAJO


% trabajo realizado por todos los recursos de trabajo.

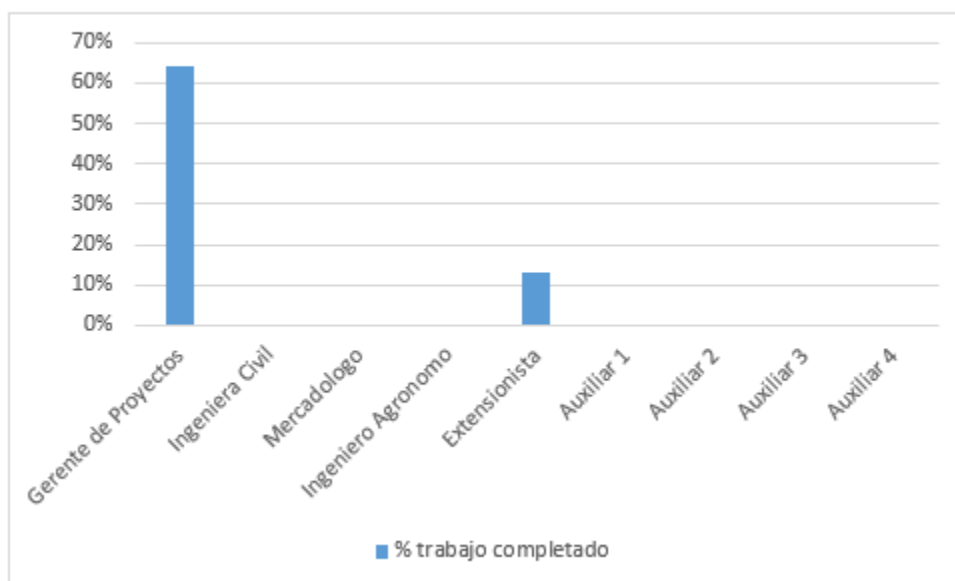

ESTADÍSTICAS DE RECURSOS

Estado de trabajo de todos los recursos de trabajo.

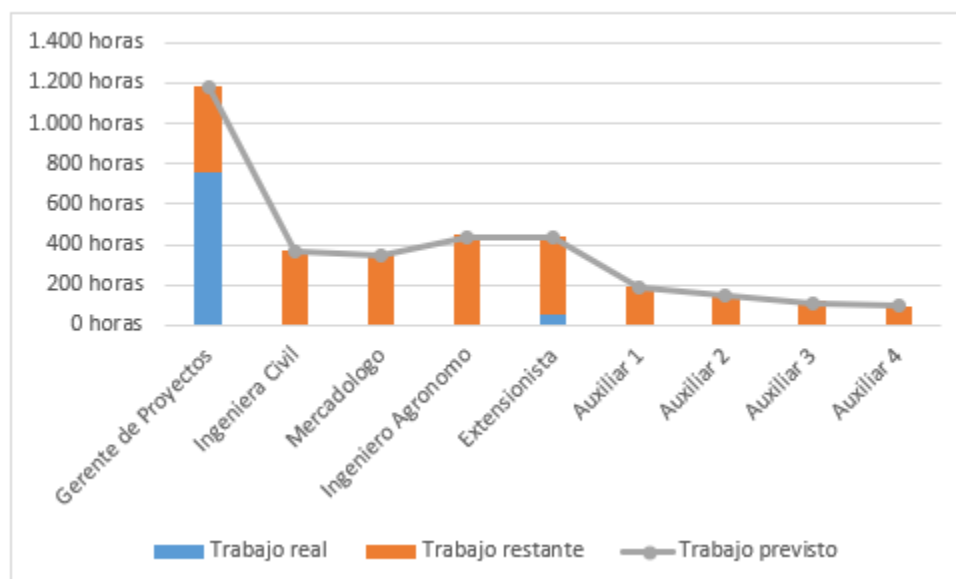

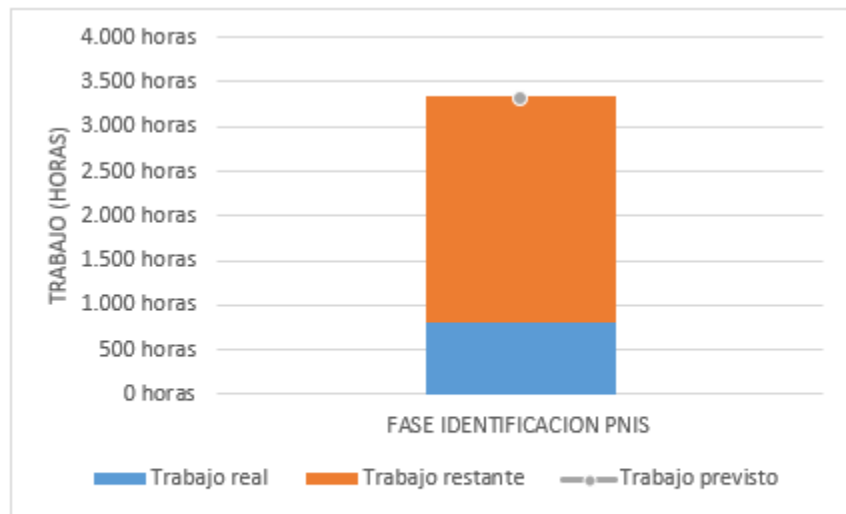

ESTADÍSTICAS DEL TRABAJO

Muestra las estadísticas del trabajo para todas las tareas de nivel superior.

Conclusiones:

- El trabajo no se ha retrasado en tiempo ni ha habido sobrecostos hasta la fecha.
- Se mantiene el IRC por encima de 1.
